




内子座 藝於遊



素屋根を組み立てる

令和7年6月30日、内子座の素屋根（仮設の屋根）を組み立てるため再びクレーン車が登場し、足場の最上部まで材料の運び上げが始まりました。内子座南側に作業用のステージが組み立てられていて、すでに設置している足場の幅に合わせてそのステージ上で屋根トラス材を組み立てていき、北側へとレールに乗せて1スパンずつ送り出していきます。高所での作業に加え、作業が進むにつれ屋根の重量も増していき、暑さ厳しき中での大変な作業となりました。

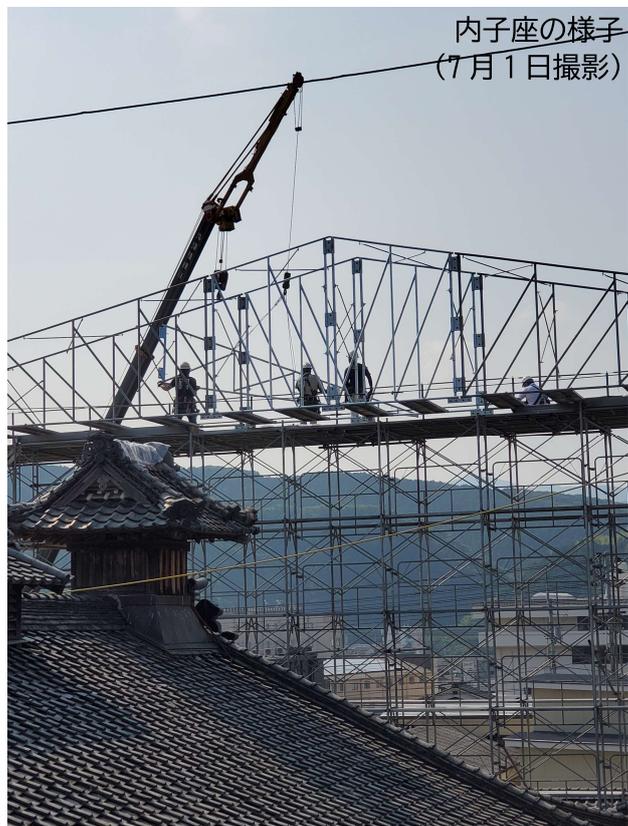


内子座の様子
(7月1日撮影)

内子座を覆っていく素屋根



写真の右側（内子座正面・南側）から左側（楽屋・北側）に向けて屋根が組みあがっていきます。

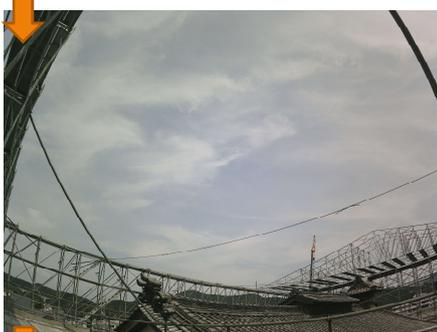

小屋組ができた後は、折板により屋根が葺かれていきます。素屋根完成までもう一息です！



見事に屋根が繋がりました！

